

Programmazione Comunitaria 2007/2013

Obiettivi Convergenza e Competitività
stato di attuazione al 31 agosto 2013

Carla Carlucci, Luigi Guerci




**INCONTRO
ANNUALE 2013**

tra la Commissione europea
e le Autorità di gestione
del PO FESR 2007/2013


Tempi di attuazione delle opere pubbliche Focus su Viabilità e Altri trasporti

Settore Viabilità

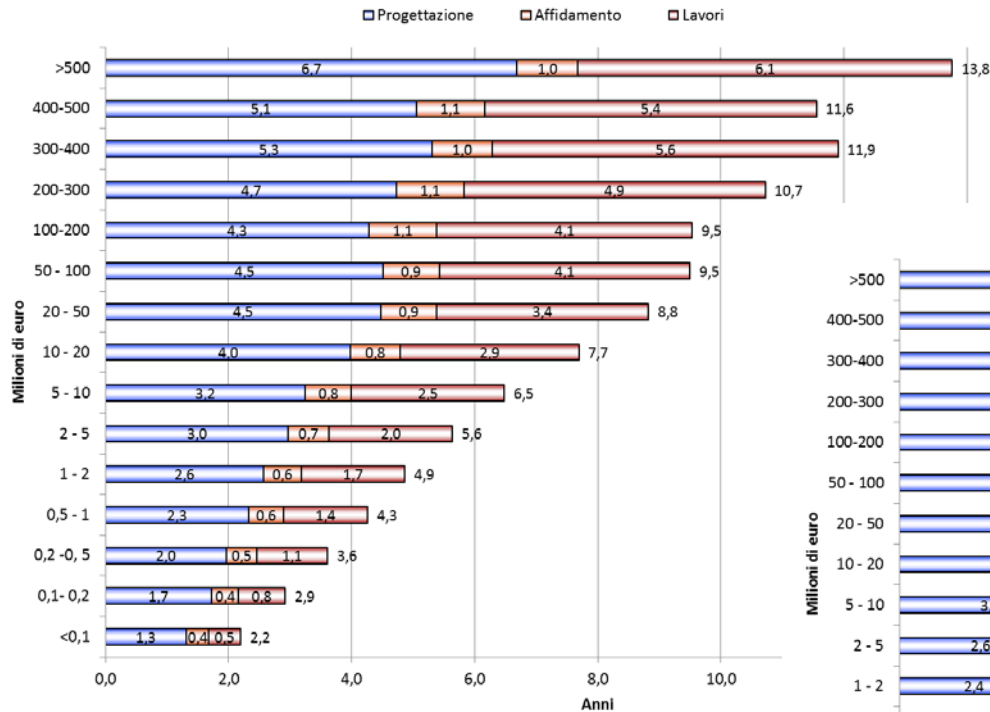

Per l'attuazione di interventi di 50 milioni di euro nel settore trasporti occorrono oltre 9 anni

Settore Altri trasporti

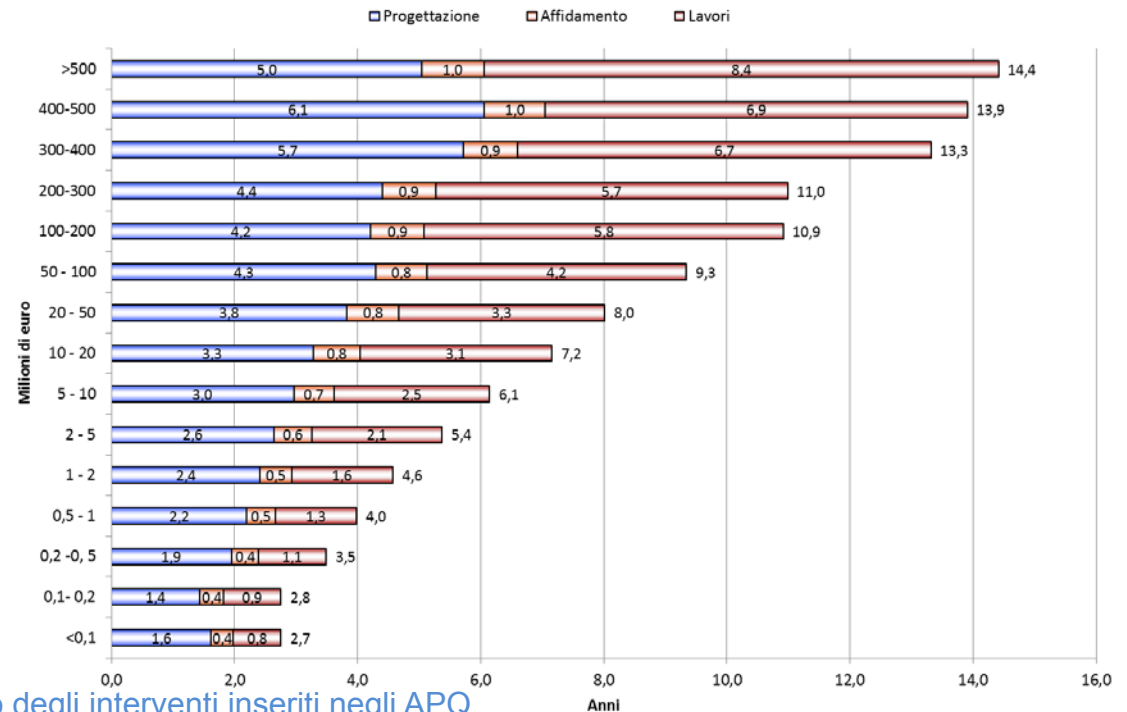


Fonte: elaborazioni UVER su dati di monitoraggio degli interventi inseriti negli APQ



INCONTRO ANNUALE 2013

tra la Commissione europea e le Autorità di gestione dei PO FESR 2007/2013

Grandi Progetti dell'Area Convergenza Confronto con le previsioni di VISTO (date effettive)

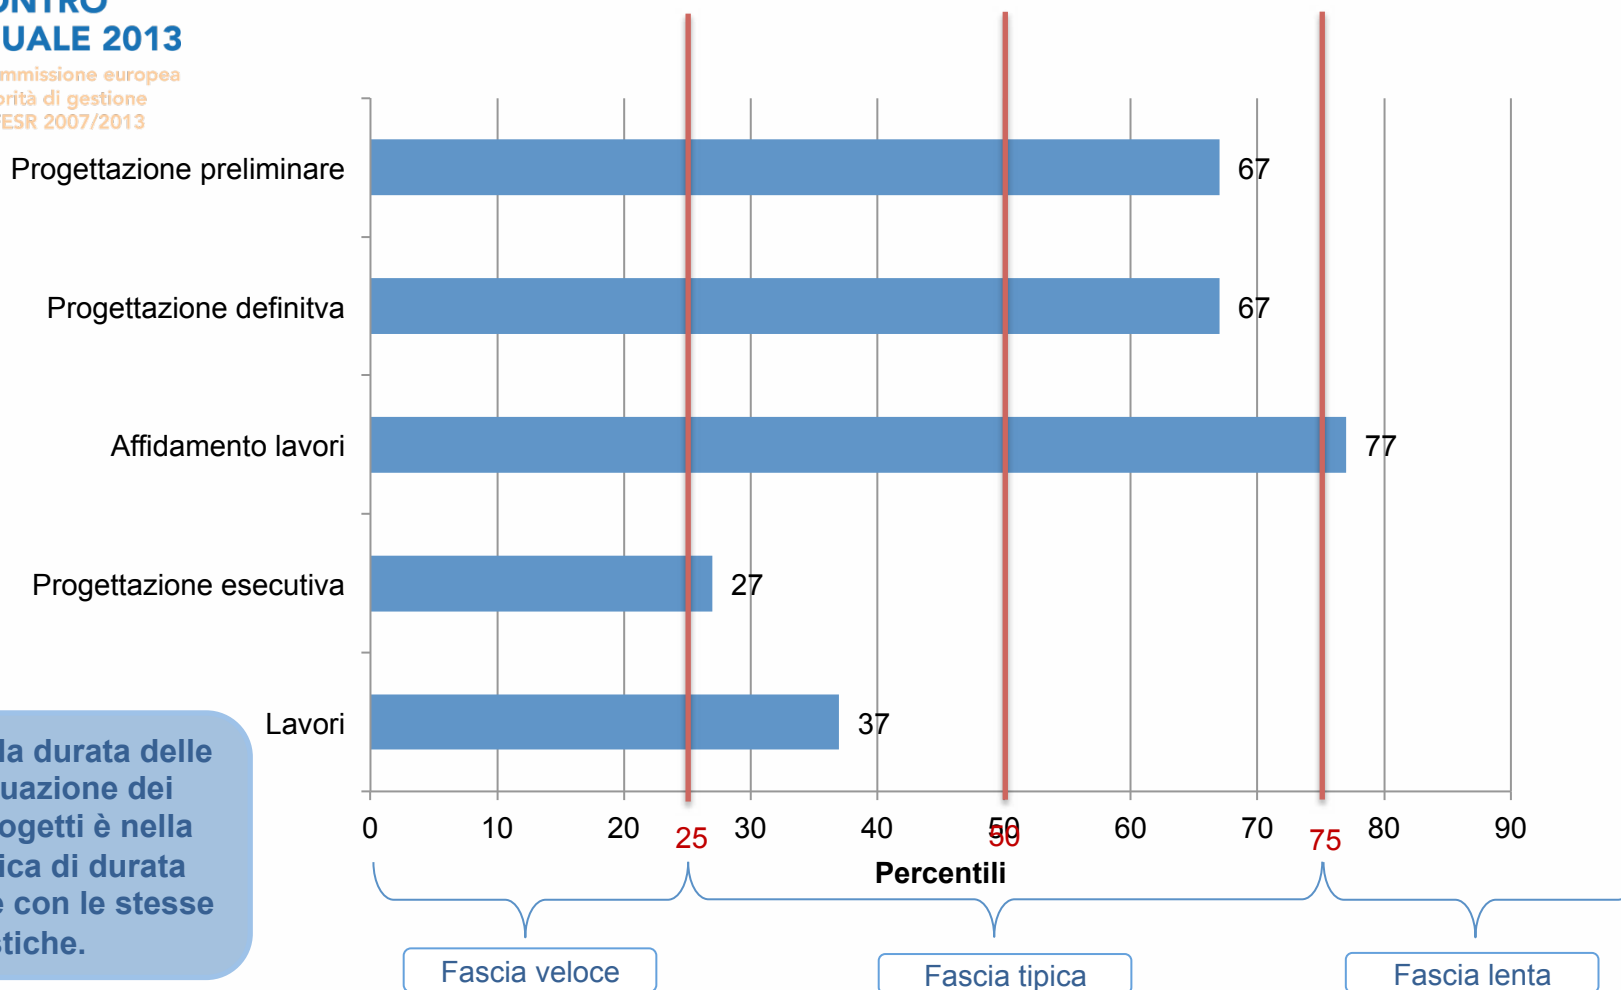

In media la durata delle fasi di attuazione dei grandi progetti è nella fascia tipica di durata per opere con le stesse caratteristiche.


Fonte: elaborazioni UVER su dati BDU



INCONTRO ANNUALE 2013

tra la Commissione europea e le Autorità di gestione dei PO FESR 2007/2013

Grandi Progetti dell'Area Convergenza Tempi medi, minimi e massimi di attuazione (durate effettive in giorni)

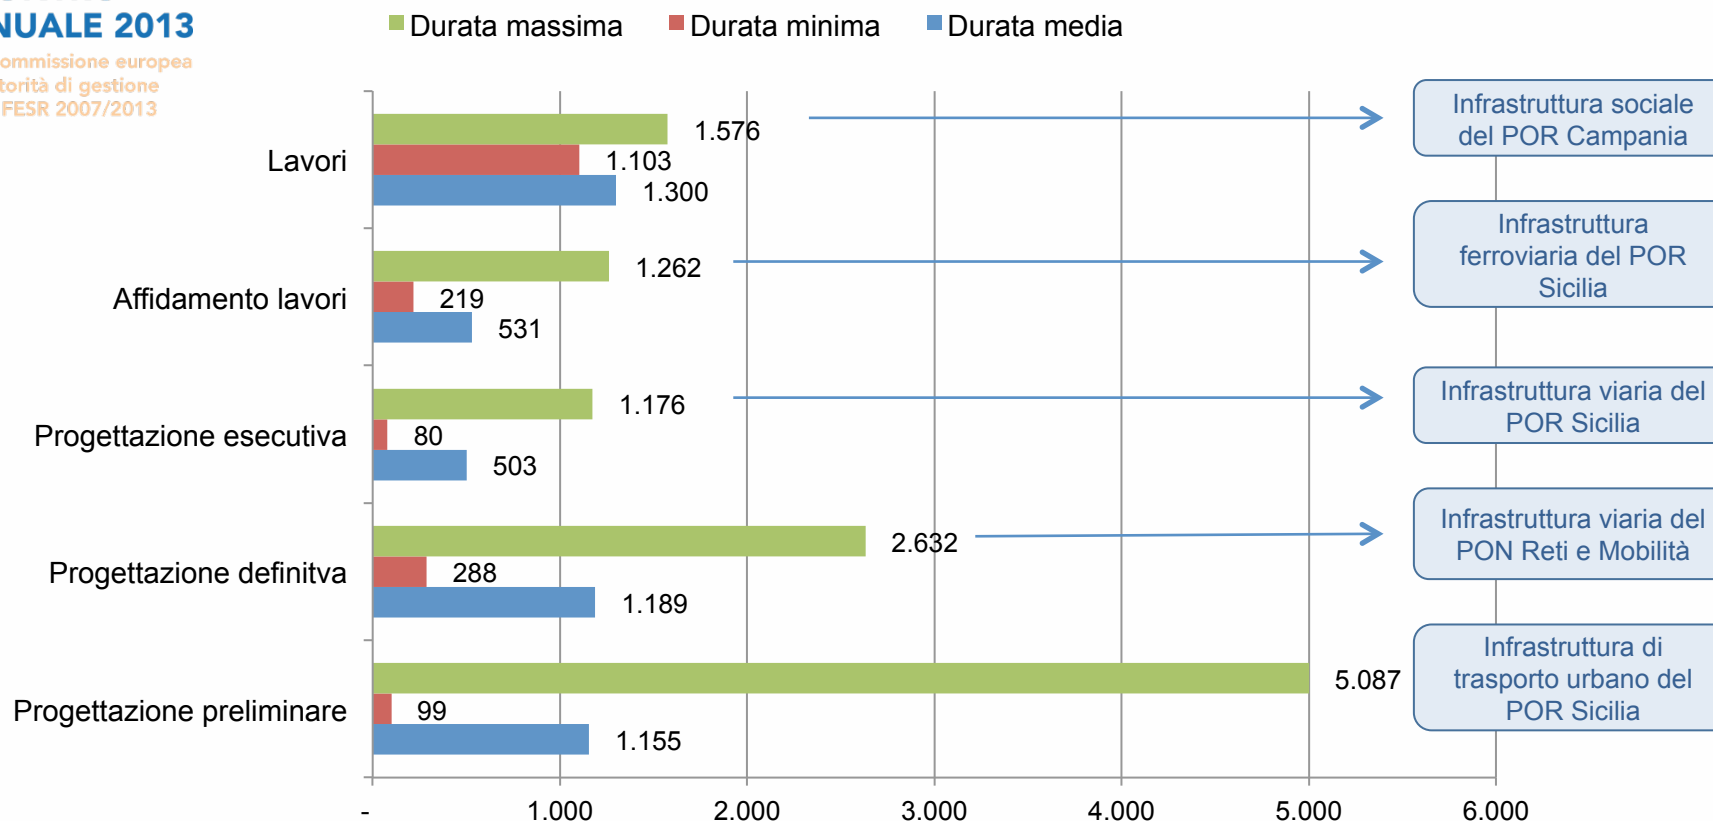

Ogni grande opera ha una propria storia; ogni fase può essere soggetta a situazioni problematiche che ne rallentano il corso

Fonte: elaborazioni UVER su dati BDU



INCONTRO
ANNUALE 2013

tra la Commissione europea
e le Autorità di gestione
dei PO FESR 2007/2013

Distribuzione dei Grandi progetti per durata dei lavori prevista in SFC e slittamento nei tempi di realizzazione dei lavori nel Sistema unico di monitoraggio

Durata	Totale	Di cui con slittamento nel tempo			
		In avanti	Indietro	Nessuno	n.d.
Aumentata	19	17		2	
Diminuita	13	5	4	2	2
Uguale	8			8	
Totale complessivo	40	22	4	12	2

Dai dati di monitoraggio risulta che circa il 50% delle durate previste dei lavori risultano incrementate. Per incompletezza delle informazioni presenti nelle basi dati, l'analisi è possibile su 40 dei 63 Grandi progetti dell'Area Convergenza

Fonte: elaborazioni UVER su dati SFC e BDU

Grandi progetti Compatibilità con i tempi della Programmazione comunitaria

Elementi che possono favorire la compatibilità con il ciclo della Programmazione europea:

- Previsioni dei tempi di attuazione realistiche e ben ponderate, basate su elementi conoscitivi il più possibile certi, scartando quindi le opere il cui futuro è gravato da «aree di incertezza» non controllabili.
- Inserimento nella Programmazione Comunitaria di grandi progetti con progettazione preliminare («sconto» di 1 anno e mezzo) o, meglio, definitiva («sconto» di 3-5 anni) approvate;
- Monitoraggio e sorveglianza dell'avanzamento procedurale: ogni grande opera ha una sua «storia» con percorsi di attuazione non sempre generalizzabili.
